



北京市建筑消防设施维护保养报告书

(☐月 ☐季 ☐半年 ☒年)

项目名称：北京国锦秋辉酒店有限公司

委托单位：北京国锦秋辉酒店有限公司

消防技术服务机构（公章）：尼特智能科技股份有限公司

项目负责人（执业资格章）：隰明明

签发日期：2025-12-24

说 明

1、下列情况下本报告无法律效力：

（1）纸质报告与北京市消防技术服务机构监督管理系统的电子报告不一致。

（2）纸质报告未经项目负责人和技术负责人手书签字及加盖执业印章。

（3）纸质报告未在规定处加盖公章和骑缝章。

（4）纸质报告涂改、页码不连续的无效。

2、应依据最新版本的北京市地方标准《建筑消防设施维护保养技术规程》对建筑消防设施进行维护保养。

3、本报告的消防设施维护保养结论是消防技术服务机构依据最新版本的北京市地方标准《建筑消防设施维护保养技术规程》中规定的技术要求和检查方法得出的。

4、本报告保存于本消防技术服务机构，保存期限为6年，必要时可进行查阅。

消防技术服务机构地址：河北省秦皇岛市海港区西港北路66号

联系人：赵晶

服务电话：03353660378

建筑消防设施维护保养报告

项目名称	北京国锦秋辉酒店有限公司		
项目地址	北京市市辖区海淀区北京市海淀区八里庄北里18号楼一层101		
委托单位	北京国锦秋辉酒店有限公司		
委托单位联系人	秦总	联系电话	13910088649
消防技术服务机构	尼特智能科技股份有限公司		
项目负责人及证书编号	隰明明 (11319000045)	技术负责人及证书编号	杨猛 (11324000021)
现场操作员及证书编号	孙铁顺 (2436003022415797)		
本次维保日期	2025-12-24至2025-12-24		
维保服务合同期限	2025-01-16至2026-01-16		
建筑物概况	总建筑面积1350平米。 1、秋果酒店，建筑面积1350平方米。地上3层，地下0层，高度10米。备注：无		
建筑物供水设施	■ 消防水箱设置位置：秋果酒店，设计容量：18 m³ ■ 消防水池设置位置：秋果酒店，设计容量：84 m³		
维护保养合同涵盖的消防系统	■ 1、消防供电配电 ■ 2、火灾自动报警系统 ■ 3、消防供水设施 ■ 4、消火栓（消防炮）系统 ■ 5、自动喷水灭火系统 □ 6、泡沫灭火系统 □ 7、气体灭火系统 □ 8、细水雾灭火系统 □ 9、干粉灭火系统 ■ 10、建筑防烟排烟系统 ■ 11、消防应急照明和疏散指示系统 ■ 12、防火分隔设施 □ 13、消防电梯 ■ 14、灭火器 □ 15、其他消防设施		
消防技术服务机构现场记录的消防设施故障	本次维护保养存在以下不合格项。 2、火灾自动报警系统-技术要求-消防电话 抽检位置是消防控制室，抽检数量是1，评判为不合格，检查结果是：总计无法呼叫分机，检查人孙铁顺。故障尚未处理。		
以往记录的消防设施故障的跟踪	2025年11月月度维保报告故障处理情况，正式报告审核通过时间是：2025-12-08 08:32:52： 2、火灾自动报警系统-技术要求-消防电话 抽检位置是消防控制室，抽检数量是1，评判为不合格，检查结果是：主机无法呼叫分机，检查人孙铁顺。故障尚未处理。 3、消防供水设施-技术要求-稳压泵、气压水罐和控制柜 抽检位置是消防泵房，抽检数量是1，评判为不合格，检查结果是：无法启动，检查人孙铁顺。故障尚未处理。 2025年10月月度维保报告故障处理情况，正式报告审核通过时间是：2025-10-20 11:09:15： 2、火灾自动报警系统-技术要求-消防电话 抽检位置是泵房，抽检数量是1，评判为不合格，检查结果是：无法正常通话，检查人钟峰。故障尚未处理。		

	年 月 日
委托单位意见	
项目单位属性说明	本项目单位属于消防安全重点单位。消防技术服务机构在消防安全重点单位库中找到的对应单位是：北京国锦秋辉酒店有限公司，地址是北京市海淀区八里庄北里18号楼一层101北京市海淀区八里庄北里18号楼一层101。

建筑消防设施维护保养详细记录

维 保 项	维 保 内 容	检查方法和要求	实 测 记 录	判 定	备 注
1、消防供电配电					
技术要求	双电源自动切换装置外观	双电源自动切换装置安装应牢固，主电源、备用电源工作状态指示应正常，标志明显，标识清晰	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	双电源自动切换装置功能	双电源自动切换装置自动切换功能应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	发电机	发电机应能自动启动，在30s内达到额定转速并发电，运行状态及显示应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，达到额定转速并发电时间（秒）是【】，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	半年
	储油	发电机和储油箱无损坏、渗漏现象，储油箱的油位应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
	通风	机房通风设施运行应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
维护要求	清洁双电源自动切换装置	清洁双电源自动切换装置、电缆及进出线表面灰尘和油污	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
	清洁发动机	清洁发动机及附属设备	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年

			此项		
	检查装置、支架和紧固件	检查装置、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
2、火灾自动报警系统					
技术要求	监视状态	火灾自动报警系统平时应处于正常的监视状态	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，报警主机厂家是【青鸟消防股份有限公司】，报警主机型号是【JB-TG--JB F-C】，注册点数是【151】，正常点数是【151】，火警点数是【0】，故障点数是【0】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	报警控制器外观	火灾报警控制器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾控制器等固定牢固、外观完好、状态显示正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，查验设备是【火灾报警控制器】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	火灾报警控制器基本功能	火灾报警控制器的自检、消音、复位、故障报警、主备电自动转换、火灾报警、联动控制等功能正常，打印机工作正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	火灾探测器	每季度应查验25%的火灾探测器的安装和周围环境；在试验烟气或温度，减光片、试验光源、测试气体作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号并启动探测器报警确认灯	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【30】，评判：合格，火灾探测器类型是【点型感烟火灾探测器】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
	手动火灾报警按钮	每季度应查验25%手动火灾报警按钮的安装和周围环境；手动	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年

		按下手动火灾报警按钮，向火灾报警控制器输出火警信号，并启动手动火灾报警按钮报警确认灯	0】，评判：合格，符合设计和规范要求		
	消防应急广播系统外观	消防应急广播系统工作状态应正常，火灾警报装置、消防应急广播扬声器安装应牢固，外观完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	消防应急广播系统功能	在自动状态模拟火灾确认条件下，检查启动消防应急广播的程序和区域以及警报装置和扬声器音质，播音区域应正确、音质清晰	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	消防电话	每月应检查消防电话总机的工作状态，用重点场所消防电话分机与消防控制室进行通话。每月用插孔电话对不少于10%的电话插孔与消防控制室进行通话，查验通话效果	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：不合格，查验设备是【消防电话总机】，总计无法呼叫分机	☐ 符合 ☒ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	火灾自动报警系统的联动控制	每季度应查验不小于25%的联动控制设备，模拟火灾状态或手动启动联动控制设备，查看各系统的动作、反馈	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1】，评判：合格，查验设备是【联动控制设备】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
维护要求	吹扫管路采样吸气式感烟火灾探测器	对管路采样吸气式感烟火灾探测器的采样管道进行吹扫	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
	清洁火灾报警控制器	清洁火灾报警控制器及联动控制器和端子箱、模块箱	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	试验备用电源	对备用电源进行1-2次充放电试验	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年

			是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求		
	清洁应急广播系统	清洁应急广播系统主机和不少于50%的扬声器	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，维护设备是【广播系统主机】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	清洁消防电话	清洁消防电话总机和消防专用电话分机	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防控制室】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	检查设备、支架和紧固件	检查设备、支架和紧固件，存在锈蚀的应及时维护	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年

3、消防供水设施

技术要求	消防水池	消防水池水位应正常，最高、最低水位报警功能应正常，消防水池补水设施应正常，寒冷地区消防水池应采取防冻措施	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店外】，数量是【1】，评判：合格，消防水池实际储水量（立方米）是【84】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	消防水箱	高位消防水箱水位应正常，消防水箱补水设施应正常，寒冷地区的消防水箱应采取防冻措施，消防水箱出水管阀门应开启并有明显标志，出水管上的止回阀关闭时应严密	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店楼顶】，数量是【1】，评判：合格，消防水箱实际储水量（立方米）是【18】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	稳压泵、气压水罐和控制柜	稳压泵、气压水罐和控制柜安装应牢固，运行平稳，无锈蚀。稳压泵控制柜应处于自动工作状态；稳压泵启动、停止运行应正常，电接点压力表的压力设定值应符合	记录人：孙铁顺 1、位置在【泵房】，数量是【1】，评判：合格，压力值设定上限（MPa）是【0.4】，压力值设定下限（MPa）是【	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年

		设计要求；管网压力显示应正常。稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志，应无跑、冒、滴、漏现象	0.2】，符合设计和规范要求		
	消防水泵控制柜及启泵	消防水泵控制柜安装应牢固、外观完好；应有注明所属系统及编号的标志，应处于自动状态。手动启停消防水泵主泵和备用泵，应运行平稳，主、备消防泵应具有自动切换功能，消防控制室应能手动启动消防水泵并显示其工作状态	记录人：孙铁顺 1、位置在【泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	消防水泵及消防管道	消防水泵及消防管道安装应牢固、外观完好、无锈蚀且铭牌清晰，消防水泵及消防管道有注明系统名称和编号的标志牌。进、出口阀门常开，启闭标志牌正确；消防水泵的进、出口应设压力表，显示正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【泵房内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	水泵接合器	水泵接合器应设标明系统、范围和压力的明显标志，水泵接合器外观完好，控制阀应常开，且启闭灵活；组件应齐全完整，无锈蚀，地下水泵接合器井内无积水、周围无遮挡物	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
	消防供水设施自动启动功能	应打开试验消火栓或末端试水装置，查看消防供水设施自动启动状态	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
维护要求	检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜	检查稳压泵控制柜和消防水泵控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
	清洁稳压泵控制	清洁稳压泵控制柜和	记录人：孙铁顺	☒ 符合	年

	柜和消防水泵控制柜	消防水泵控制柜的内外机柜	1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☐ 不符合 ☐ 不适用	
	清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道	清洁稳压泵、气压水罐、消防水泵及消防管道	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	润滑消防水泵传动机构和阀门丝杆	对消防水泵传动机构和阀门丝杆进行润滑处理	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	润滑水泵接合器闷盖和阀门丝杆	5、对水泵接合器闷盖和阀门丝杆加黄油润滑	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	启闭阀门	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护	记录人：孙铁顺 1、位置在【消防泵房】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
4、消火栓（消防炮）系统					
技术要求	室内消火栓	室内消火栓箱安装应牢固，外观完好且有明显标志，箱内组件齐全完好，箱门开关灵活。室内消火栓不应被遮挡、圈占。每月应检查不少于10%的消火栓箱，一年内应检查所有消火栓箱	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店3层】，数量是【3】，评判：合格，查验设备是【消火栓箱】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	消防炮	消防炮安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，回转与俯仰角度及定位机构灵	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年

	活。电控消防炮控制装置状态正常	合同范围内，无此项		
室内、外消火栓系统管网	室内、外消火栓系统管网安装应牢固、外观完好、无变形、无渗漏、无锈蚀。管道阀门标识完整准确，寒冷地区管网应采取防冻措施	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
室外消火栓安装	室外消火栓安装应牢固，外观完好，无变形和机械损伤，组件齐全，开关灵活，地下消火栓标识应清晰，井内无积水	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
室内消火栓最不利处静压	使用消火栓系统试水检测装置，选择最不利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力并记录	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店三层】，数量是【1】，评判：合格，栓口处静压（MPa）是【0.17】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
室内消火栓最不利处动压	选择最不利点处消火栓连接消火栓系统试水检测装置进行试水试验，查看消防水泵房内消防水泵启动和反馈信号，测量并记录最不利点处消火栓的出水压力	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店三层】，数量是【1】，评判：合格，栓口处动压（MPa）是【0.26】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
室内消火栓最有利处静压	使用消火栓系统试水检测装置，选择最有利处消火栓，连接压力表及关闭闷盖，开启消火栓，测量栓口静水压力并记录	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店1层】，数量是【1】，评判：合格，栓口处静压（MPa）是【0.25】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
室外消火栓出水及压力	利用消火栓系统试水检测装置，测量室外消栓栓口静压和动压，应符合规范要求	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【1】，评判：不在合同范围内，栓口处动压（MPa）是【】，栓口处静压（MPa）是【】，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
消防炮进行喷水试验	触发启泵按钮和消防炮控制阀，查看消防	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此	☐ 符合 ☐ 不符合	季/年

		炮进口压力	项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，进口压力（MPa）是【】，无此项	■ 不适用	
维护要求	润滑地下消火栓闷盖和阀门丝杆	对地下消火栓闷盖和阀门丝杆加黄油润滑	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	年
	启闭阀门	对消防管网主要阀门进行一次开启和关闭操作	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	润滑消防炮转动部分	对消防炮转动部分加黄油润滑	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【1】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ■ 不适用	年
	润滑旋转式消火栓的转动部位	对旋转式消火栓的转动部位加机油或黄油润滑	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【10】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	清洁消火栓箱	清洁不少于10%的消火栓箱外部和箱内组件	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内3层】，数量是【3】，评判：合格，维护设备是【消火栓箱】，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【1】，评判：合格，符合设计和规范要求	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
5、自动喷水灭火系统					
10、建筑防烟排烟系统					
技术要求	风机控制柜	风机控制柜安装牢固，外观完好，有注明系统名称和编号的标	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店楼顶】，数量是	■ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年

	志，工作状态正常	【2】，评判：合格，符合设计和规范要求		
风机外观	风机安装牢固，外观完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
风机功能	手动启动风机，风机应正常运转，运转平稳、无异常振动与声响。能在消防控制室手动启停风机，接收反馈信号。测试风机的风量应与风机铭牌相符	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店楼顶】，数量是【1】，评判：合格，风机种类是【排烟风机】，风量（立方米/秒）是【6.2】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
风管	系统风管表面应平整，无破损、变形、锈蚀现象，风管固定应牢固、外观完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
挡烟垂壁外观	挡烟垂壁外观完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
挡烟垂壁功能	手动操作挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止。模拟火灾，挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度，挡烟垂壁动作到位后应能将状态信号反馈到消防控制室	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
自动排烟窗外观	自动排烟窗外观完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
自动排烟窗功能	手动操作排烟窗开关进行开启、关闭试验，排烟窗动作应灵敏、可靠。模拟火灾，	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年

	相应区域火灾报警后，同一防烟分区内排烟窗应能联动开启，状态信号应反馈到消防控制室	合同范围内，无此项		
送风阀、排烟阀外观	送风阀、排烟阀等固定应牢固、外观完好、标志明显清晰	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【6】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
送风阀、排烟阀功能	手动开启、复位，动作应灵敏、可靠，关闭严密。模拟火灾，常闭送风口和排烟阀应联动开启；阀门状态信号应反馈到消防控制室；阀门开启后应能联动相应的风机启动	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【6】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
排烟防火阀外观	排烟防火阀外观应完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【6】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
排烟防火阀功能	手动启动排烟风机，关闭排烟风机入口总管上设置的排烟防火阀（280℃），排烟风机应自动关闭	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【6】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
防烟系统联动功能	防烟系统联动功能应符合要求：当任何一个常闭送风口开启时，相应的送风机均应能联动启动；当防火分区内火灾确认后，应在15s内启动相应的送风口、送风机，其状态信号应反馈到消防控制室。前室、封闭避难层（间）与走道之间的压差应为25Pa~30Pa；楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，送风口启动时间（秒）是【】，送风机启动时间（秒）是【】，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
机械排烟系统的联动功能	机械排烟系统的联动功能应符合要求：当任何一个常闭排烟阀	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【6】	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年

		或排烟口开启时，排烟风机均应能联动启动。当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统应启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机；启动的排烟阀或排烟口、排烟风机应与设计和标准要求一致，其状态信号应反馈到消防控制室。有补风要求的场所，火灾确认后，补风系统应启动	】，评判：合格，防烟分区排烟口风量（立方米/秒）是【6.2】，符合设计和规范要求		
维护要求	清洁风机控制柜	清洁防烟排烟风机控制柜	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	检查风机控制柜	清检查风机控制柜内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	季/年
	润滑传动机构	对风机传动机构、叶轮、风机轴承进行润滑处理	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年
	清洁风口和排烟口	清洁送风口、风机进风口和排烟口	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	润滑传动机构	对送风阀、排烟阀、排烟防火阀、防火阀等传动机构进行润滑处理	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	检查设备、管道及支架	检查设备、管道及支架，存在锈蚀的应及时维护	记录人：孙铁顺 1、位置在【楼顶】，数量是【2】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年


			要求		
11、消防应急照明和疏散指示系统					
技术要求	系统外观	应急照明灯具和疏散指示标志安装应牢固、外观完好、无遮挡，工作状态正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【39】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	手动应急启动功能	应急照明灯具和疏散指示标志的手动应急启动功能应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【39】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	自动应急启动功能	应急照明灯具和疏散指示标志的自动应急启动功能应正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【39】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	应急工作持续时间	应对每台灯具进行1次蓄电池电源供电状态下的应急工作持续时间检查，应急工作持续时间应符合要求	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【2】，评判：合格，持续应急工作时间（分钟）是【30】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
维护要求	清洁灯具和标志	对应急照明集中电源、应急照明灯具和疏散指示标志进行一次全面清洁	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【39】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	更换蓄电池电源	对灯具蓄电池电源供电状态下，应急工作持续时间不符合要求的应及时更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【0】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
12、防火分隔设施					
技术要求	防火门安装与外观	防火门安装应牢固，外观完好，应有“保持防火门关闭”标识。门框与墙体密封严密	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年

防火门组件	防火门组件齐全完整、无缺失，状态正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
防火门功能	防火门应具有自行关闭功能，双扇防火门具有按顺序关闭功能，防火门关闭应严密，防火密封条应完好。每月应检查不少于10%的防火门，一年内检查完毕	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：合格，查验设备是【防火门】，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
常开防火门功能	常开防火门应能在火灾时自行关闭，具有反馈功能。每季度应检查25%的常开防火门，一年内检查所有常开防火门	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，查验设备是【常开防火门】，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
防火门周围	防火门周围不应有障碍物	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
防火卷帘门电控箱	防火卷帘门电控箱安装牢固，外观完好，工作状态正常	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
防火卷帘外观与组件	防火卷帘外观完好，导轨牢固无机械损伤。防火卷帘组件应齐全完整，紧固件无松动，操作按钮完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
防火封堵	防火卷帘与楼板、梁、柱之间的空隙防火封堵应完好	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	月/季/年
手动控制防火卷帘	手动控制防火卷帘操作按钮控制防火卷帘的升降，查看防火卷帘运行，升降到位情	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年

		况	合同范围内，无此项		
	防火卷帘自动降落功能	模拟探测器报警的火灾状态或消防控制室手动控制防火卷帘控制模块，检查防火卷帘自动降落和反馈信号	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
	防火窗和电动防火阀	防火窗和电动防火阀外观完好，开启复位灵活，关闭应严密。检查防火窗防火密封条	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
维护要求	维护防火卷帘控制箱	清洁防火卷帘控制箱，检查防火卷帘控制箱内电器元件有无松动、烧损现象，及时紧固或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
	润滑防火门合页	对防火门合页加注润滑油一次	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
	调整调节防火门螺丝	对关闭速度过慢的防火门，及时调整调节螺丝	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【8】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
	清理和润滑防火卷帘门导轨	清理防火卷帘门导轨内杂物，并加涂黄油润滑一次	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
	润滑卷帘门传动链条链轮	对卷帘门传动链条链轮等装置加注润滑油一次	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	季/年
	润滑电动防火阀、排烟窗	对电动防火阀、排烟窗的转动部位加注润滑油一次	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年

			此项		
	更换故障件	对检查出现的不符合现象进行维护或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【无此项】，数量是【0】，评判：不在合同范围内，无此项	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 不适用	年
14、灭火器					
技术要求	灭火器外观和设置	1、灭火器外观应完好，灭火器筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，组件应齐全完好，无松动、脱落或损伤。 2、灭火器铭牌或“灭火器维修合格证”应清晰，灭火器应在有效期和报废年限内。压力表指针应在绿色区域范围内，二氧化碳灭火器重量应与铭牌一致。 3、灭火器设置应有明显标志且摆放稳固，铭牌应朝外，灭火器箱不得上锁；应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【40】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	月/季/年
	灭火器的规格型号、数量和放置地点	灭火器的规格型号、数量和放置地点应符合设计要求	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【40】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	年
维护要求	维护灭火器	清洁灭火器，发现有锈蚀、胶管老化、压力不正常、达到使用年限的灭火器及时维护或更换	记录人：孙铁顺 1、位置在【酒店内】，数量是【40】，评判：合格，符合设计和规范要求	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不适用	半年

从业人员身份比对

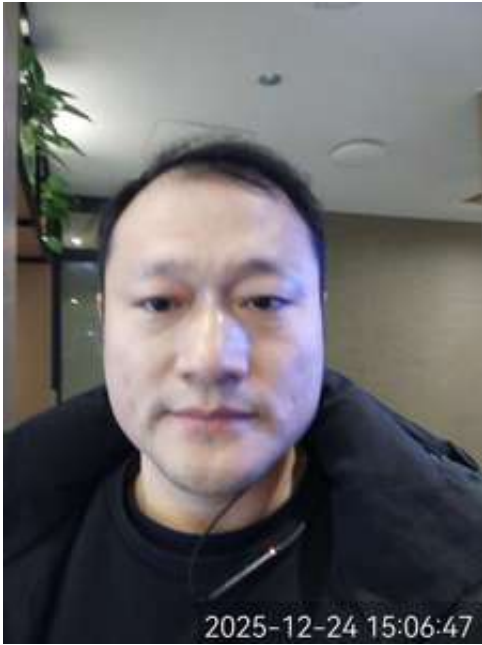
人员类别	操作员	比对环节	创建任务
人员姓名	孙铁顺	比对时间	2025-12-24 15:06:46
备案照片		现场上传照片	
			

人员类别	项目负责人	比对环节	维保检测记录签到
人员姓名	隰明明	比对时间	2025-12-24 15:07:28
备案照片		现场上传照片	




操作员在项目现场活动GPS轨迹

操作员：孙铁顺 2025-12-24当天GPS活动轨迹

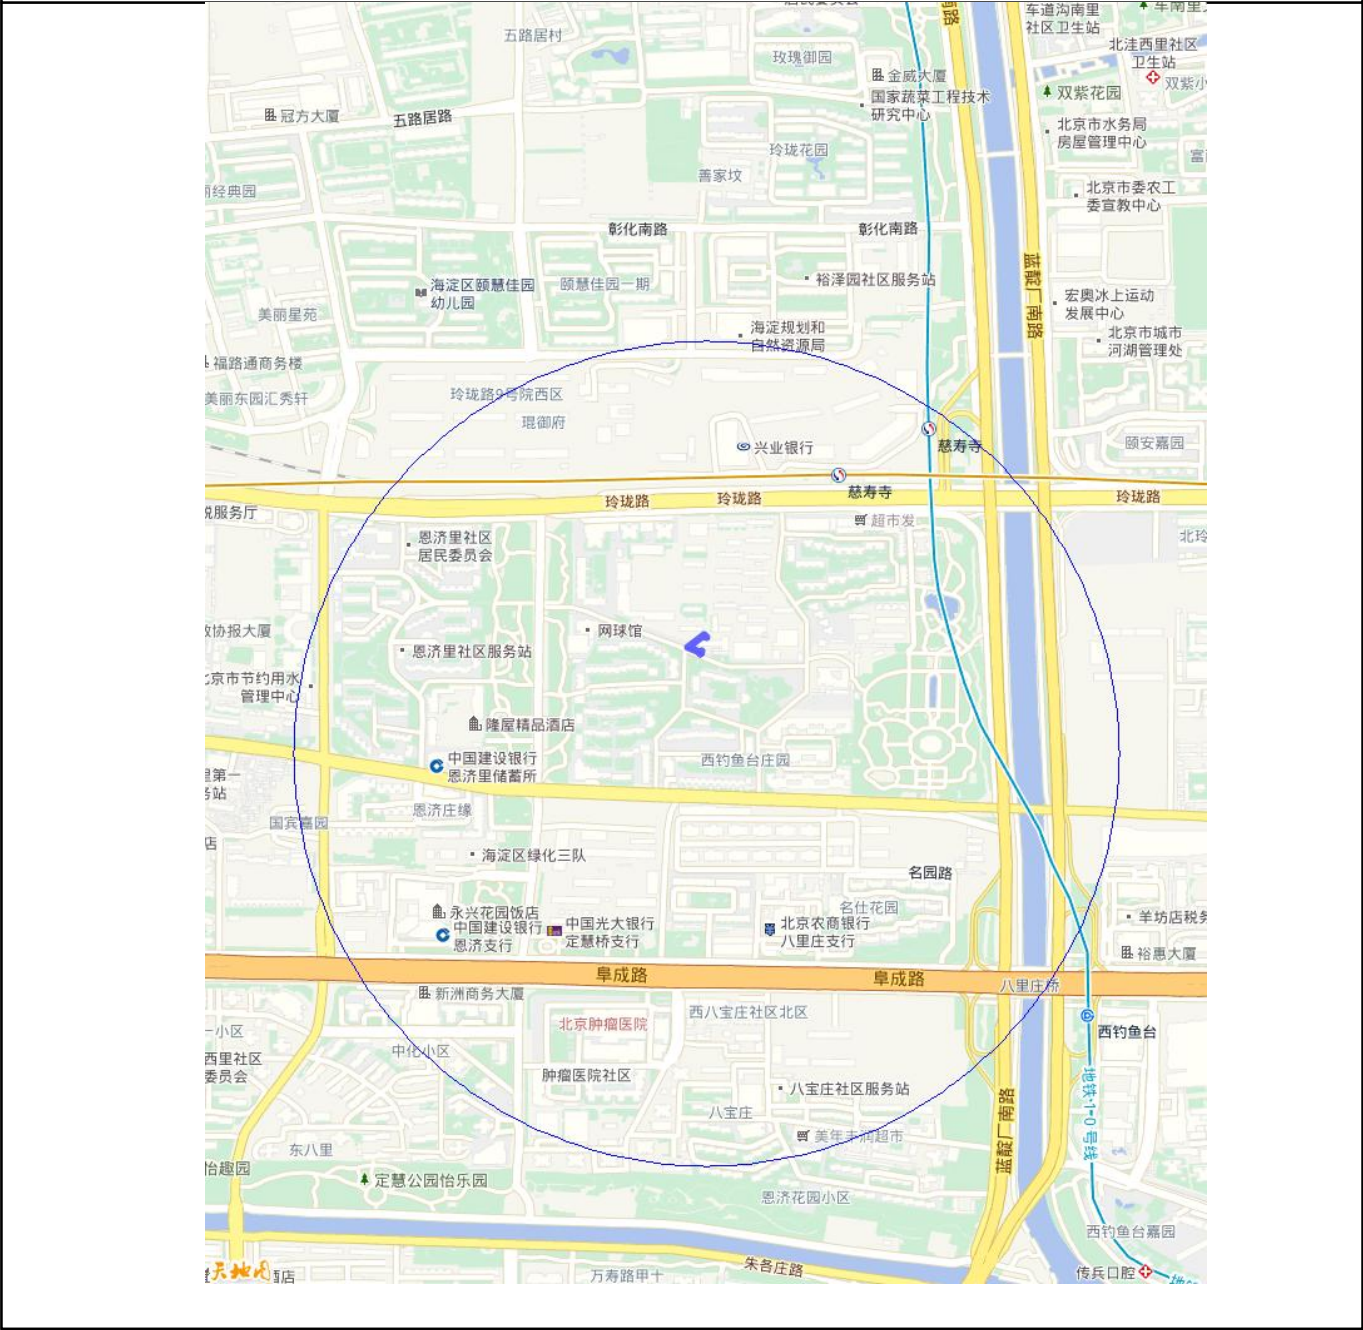

项目负责人现场签到记录

项目负责人 隰明明 2025-12-24 13:34:06 维保开始前现场签到
项目负责人 隰明明 2025-12-24 15:07:28 现场确认操作员提交的维保记录

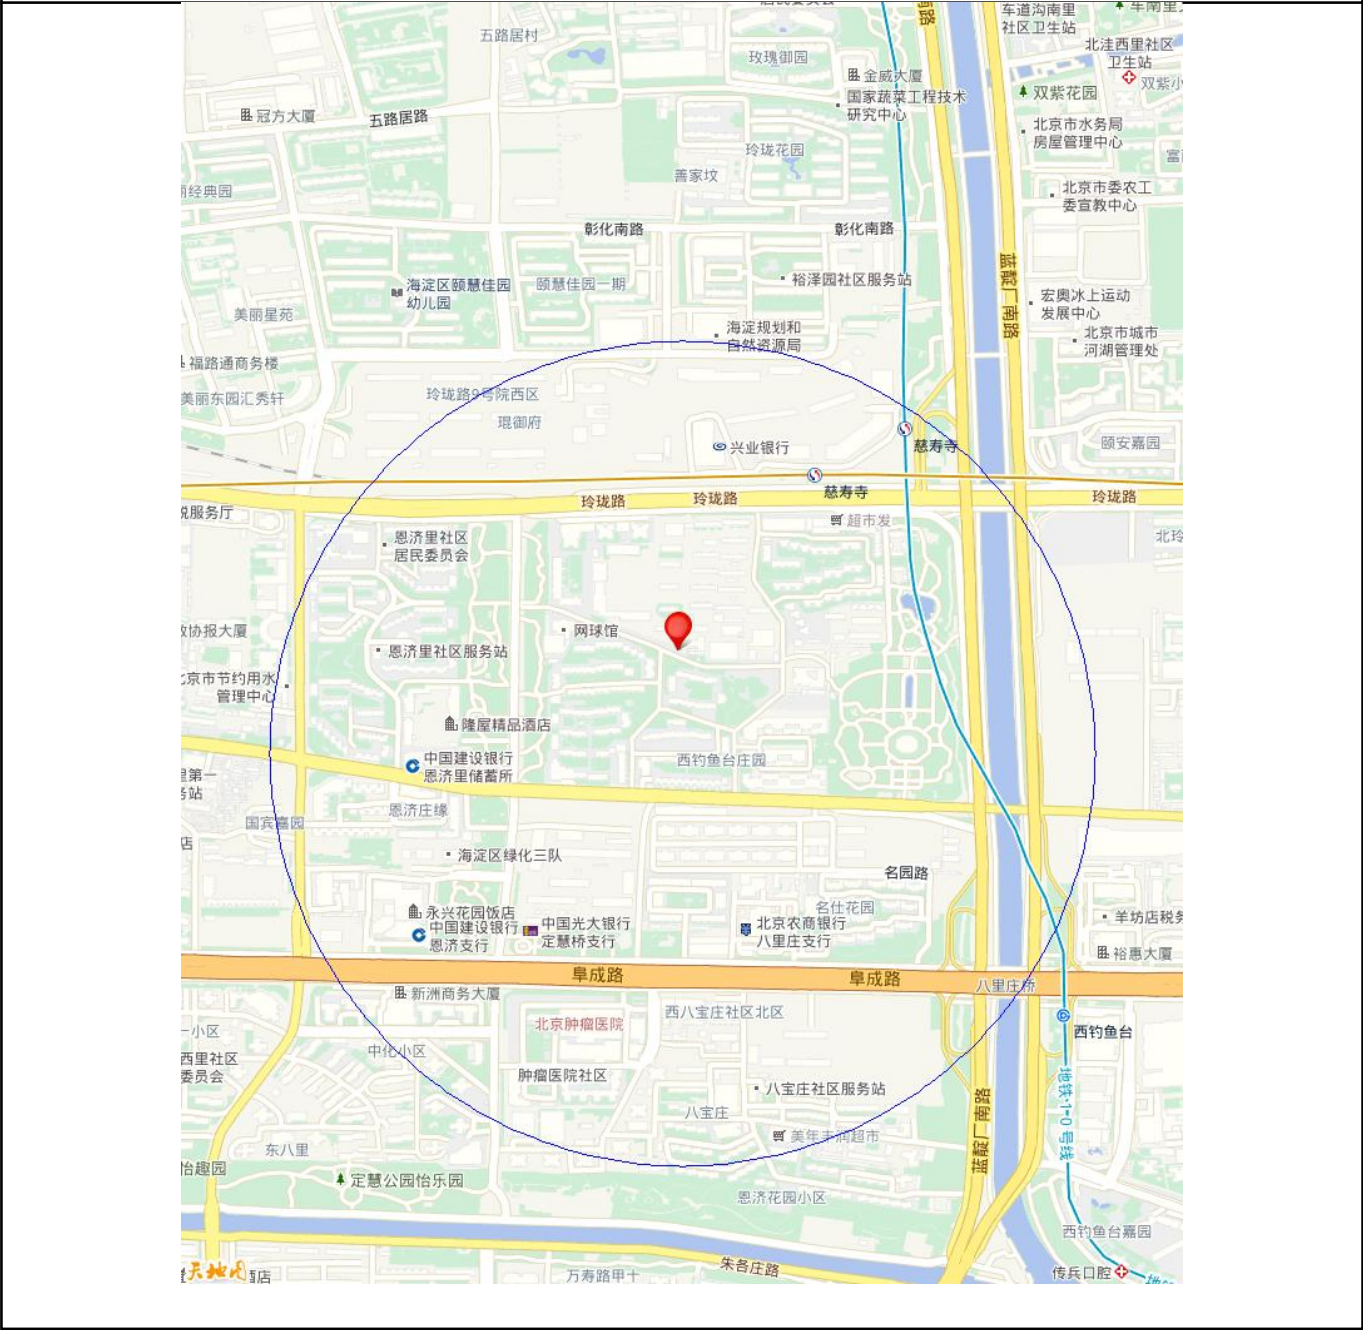

现场维保记录照片

维保内容	【1、消防供电配电】-技术要求-双电源自动切换装置外观
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店泵房 
维保内容	【2、火灾自动报警系统】-技术要求-监视状态
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在消防控制室 
维保内容	【2、火灾自动报警系统】-技术要求-火灾探测器
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店内 

维保内容	【2、火灾自动报警系统】-技术要求-手动火灾报警按钮
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店内 
维保内容	【2、火灾自动报警系统】-技术要求-消防应急广播系统外观
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在消防控制室 
维保内容	【2、火灾自动报警系统】-技术要求-消防电话
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在消防控制室 
维保内容	【3、消防供水设施】-技术要求-消防水池
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员：	位置在酒店外

孙铁顺	
维保内容	【3、消防供水设施】-技术要求-消防水箱
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店楼顶 
维保内容	【3、消防供水设施】-技术要求-稳压泵、气压水罐和控制柜
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在泵房  

	
维保内容	【3、消防供水设施】-技术要求-消防水泵控制柜及启泵
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在泵房 
维保内容	【4、消火栓（消防炮）系统】-技术要求-室内消火栓最不利处静压
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店三层  
维保内容	【4、消火栓（消防炮）系统】-技术要求-室内消火栓最不利处动压
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店三层

	 
维保内容	【4、消火栓（消防炮）系统】-技术要求-室内消火栓最有利处静压
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店1层 
维保内容	【10、建筑防烟排烟系统】-技术要求-风机外观
说明	照片右下角有时间水印。
照片提交人员： 孙铁顺	位置在酒店楼顶  
